

	(B)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecess	Custo	Nomes dos Recursos	Т
1		Levantamento de Requisitos	18 dias?	23/02/24 09:00	20/03/24 09:00		R\$ 21800,00		+
2		Abertura (kickoff) do projeto	1 dia?	23/02/24 09:00	26/02/24 09:00		R\$ 1600,00	Josué Nogueira	1
3		Definição do escopo do projeto	2 dias	26/02/24 09:00	28/02/24 09:00	2	R\$ 6400,00	Josué Nogueira;Leonardo Avelar;Lucas	1
4		Elicitação de Requisitos	2 dias	28/02/24 09:00	01/03/24 09:00	3	R\$ 1600,00	André Silva	1
5		Verificação de requisitos	3 dias	01/03/24 09:00	06/03/24 09:00	4	R\$ 2400,00	Ana Carvalho	1
6		Analise de risco	3 dias	06/03/24 09:00	11/03/24 09:00	5	R\$ 2400,00	João Alves	1
7		Orçamento do projeto	4 dias	11/03/24 09:00	15/03/24 09:00	6	R\$ 3200,00	André Silva	1
8		Licença de Software	1 dia?	15/03/24 09:00	18/03/24 09:00	7	R\$ 1000,00	Licença de utilização do Google Maps	1
9		Apresentação de solução para o cliente	1 dia	18/03/24 09:00	19/03/24 09:00	8	R\$ 1600,00	Josué Nogueira	1
10		Aprovação do plano do projeto	1 dia	19/03/24 09:00	20/03/24 09:00	9	R\$ 1600,00	Josué Nogueira	
13	•	Desenvolvimento	46 dias	20/03/24 09:00	23/05/24 09:00		R\$ 66400,00		
14		Planejamento das telas do app		20/03/24 09:00	25/03/24 09:00	10		Leonardo Avelar;Lucas Diniz	1
15		Iniciar desenvolvimento inicial das telas	7 dias	25/03/24 09:00	03/04/24 09:00	14	R\$ 11200,00	Leonardo Avelar;João Alves	1
16	ö	Maior detalhamento das telas	4 dias	03/04/24 09:00	09/04/24 09:00	15	R\$ 6400,00	Leonardo Avelar;João Alves	1
17	8	Desenvolver fluxo de navegação entre telas	2 dias	09/04/24 09:00	11/04/24 09:00	16	R\$ 3200,00	João Alves;Ana Carvalho	1
18		Integrar funções do GPS	2,5 dias	11/04/24 09:00	15/04/24 14:00	17	R\$ 4000,00	André Silva;João Alves	1
19		Integrar função de cadastro	2 dias	11/04/24 09:00	15/04/24 09:00	17	R\$ 3200,00	André Silva;Ana Carvalho	1
20		Integrar contato de emergência	4 dias	11/04/24 09:00	17/04/24 09:00	17	R\$ 6400,00	Lucas Diniz;Ana Carvalho	1
21		Integrar analise de rota	5 dias	11/04/24 09:00	18/04/24 09:00	17	R\$ 4000,00	João Alves	1
22		Integrar analise de comportamento veicular	7 dias	11/04/24 09:00	22/04/24 09:00	17	R\$ 5600,00	Lucas Diniz	1
23	Ö	Testar App em situações de ambiente controlado	15 dias	22/04/24 09:00	13/05/24 09:00	18;19;2	R\$ 12000,00	Ana Carvalho	1
24		Testar App em ambiente real (no transito)	7 dias	13/05/24 09:00	22/05/24 09:00	23	R\$ 5600,00	André Silva	1
25		Conclusão do App	1 dia	22/05/24 09:00	23/05/24 09:00	24	R\$ 0,00		-
28	•	Implantação	74 dias?	19/03/24 09:00	01/07/24 09:00		R\$ 85100,00		1
29		Configuração de ambiente de Banco de Dados		19/03/24 09:00	20/03/24 09:00			Servidor de Banco de Dados	1
30	\dagger	Configuração de Servidor Web	1 dia?	19/03/24 09:00	20/03/24 09:00		R\$ 1500.00	Servidor Web	+
31	Ö	Aquisição de um Veiculo para Testes		19/03/24 09:00	20/03/24 09:00			Aluguel de carros	1
32		Lançamento do Produto		23/05/24 09:00	24/05/24 09:00	25		Josué Nogueira	1
33		Divulgação do produto / Publicidade		24/05/24 09:00	07/06/24 09:00	32		Carlos Andrade; Vinicius Souza	1
34		Manutenção do produto		07/06/24 09:00	28/06/24 09:00	33	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	João Alves;André Silva;Ana Carvalho	+


SafeRoute- Página1

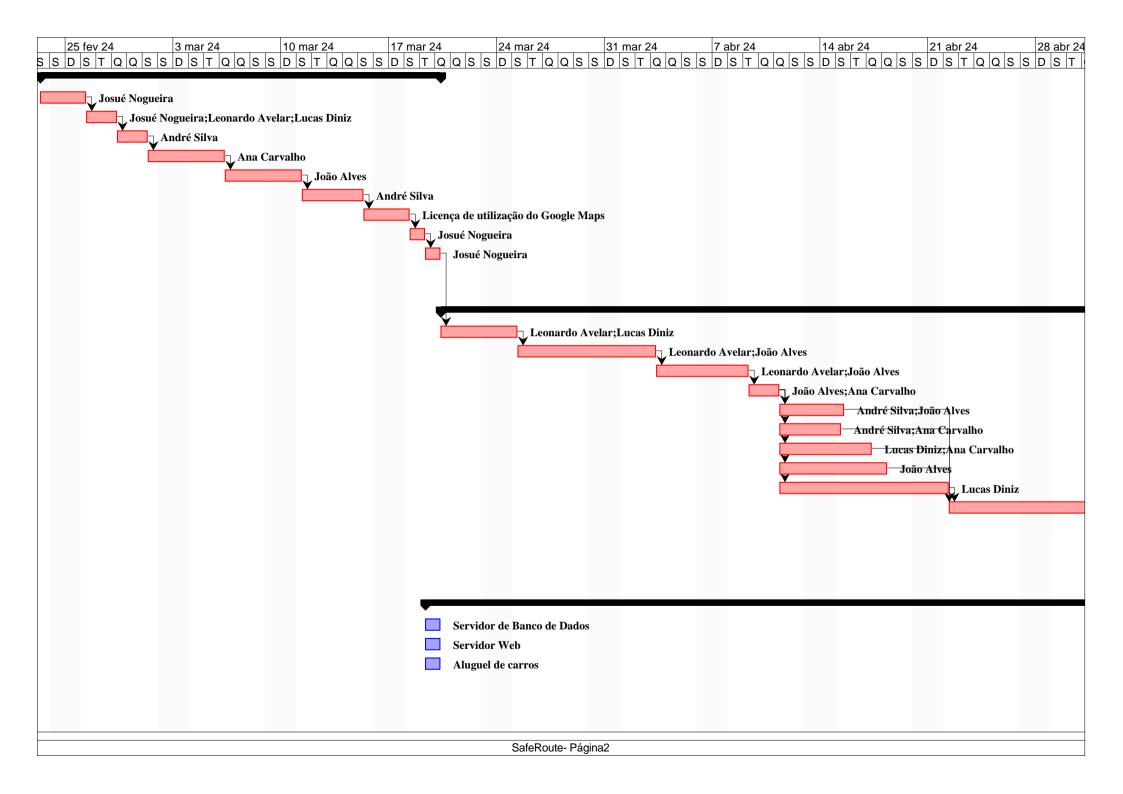


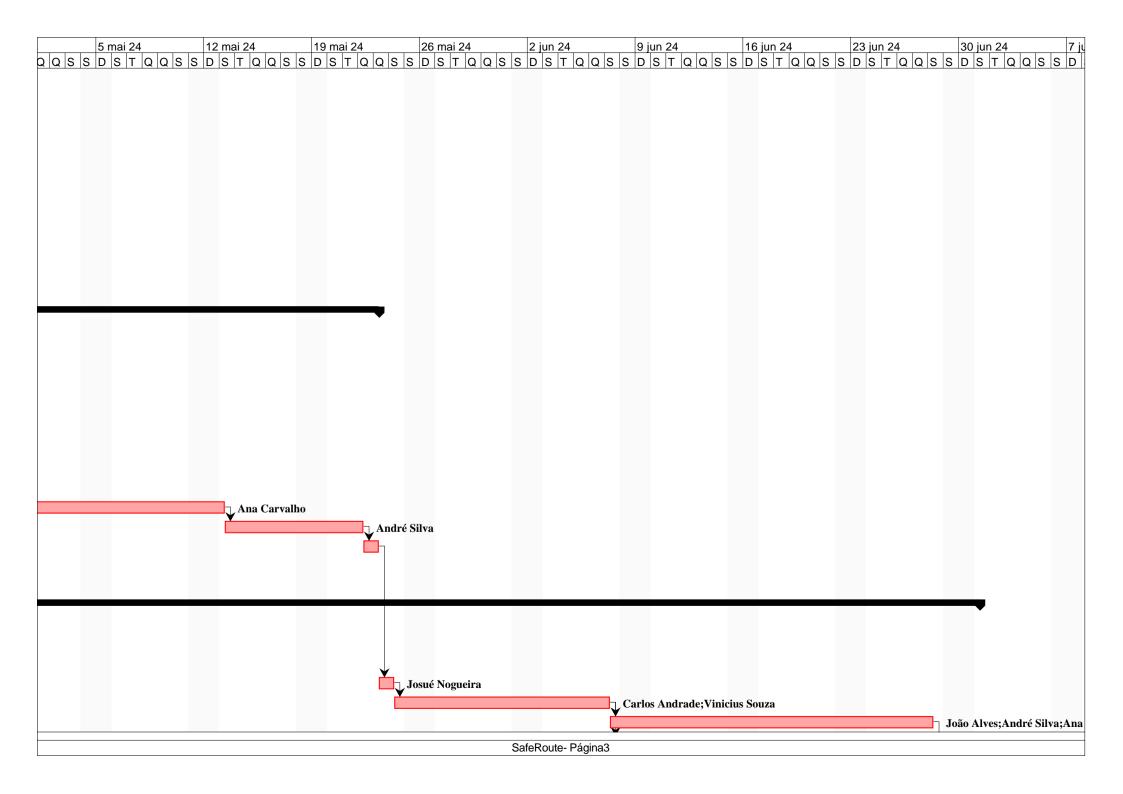

.1.0	24					1 1	:	24	<u> </u>				24	:1	24					20	:1	24	
ıl 2 S	74 T	O	Q	S	s	D D	S	T	ဂ	O	s	s	21 D	S	∠4 T	ဂ ဂ	O	s	s	Z8 D	jul S	∠4 T	O O
										_			_			_				_			_
Ca	arv	alh	0																				
									Saf	eR	oute	e- F	Pági	na	4								\dashv

	(B)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecess	Custo	Nomes dos Recursos			
35		Ajustar o app de acordo com os Feedbacks recebidos		07/06/24 09:00	21/06/24 09:00	33		Leonardo Avelar;Lucas Diniz	TQQ		
36		Aceite Final		28/06/24 09:00	01/07/24 09:00	34;35	R\$ 0,00				
		, teste i mai	i dia.	20/00/24 00:00	01/01/24 00.00	04,00	1 (φ 0,00				
				SafeRo	ute- Página5						

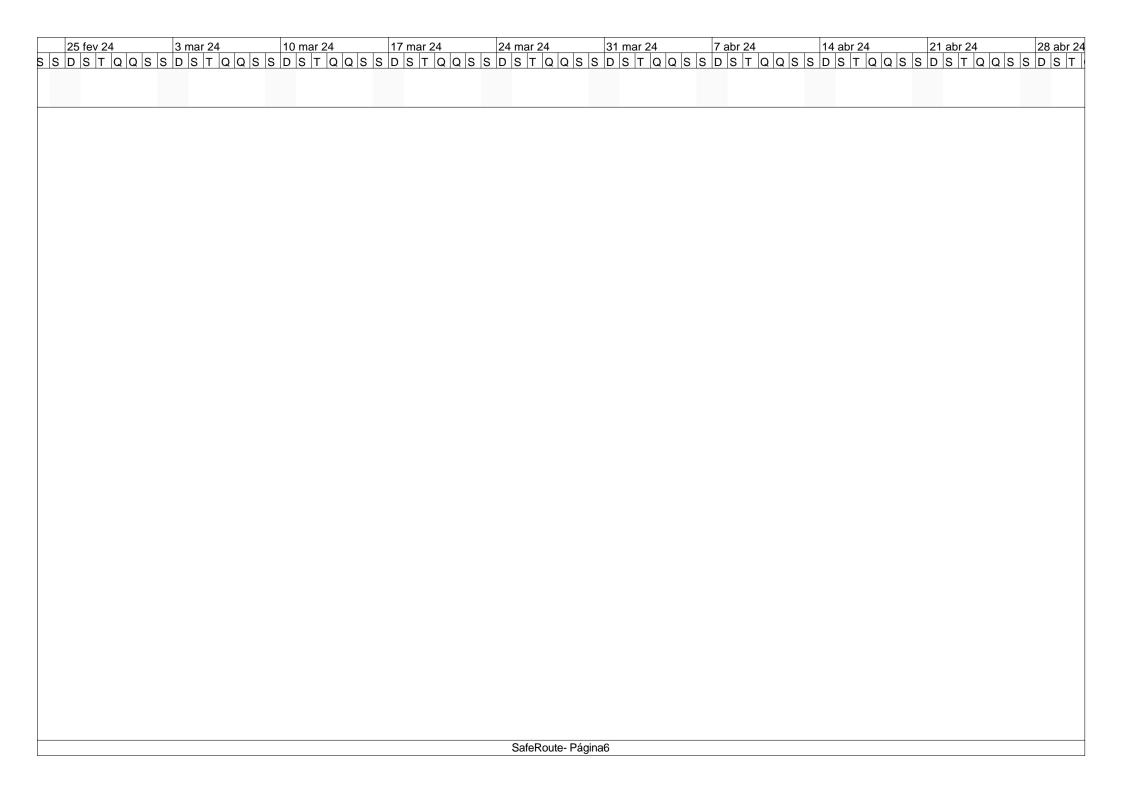

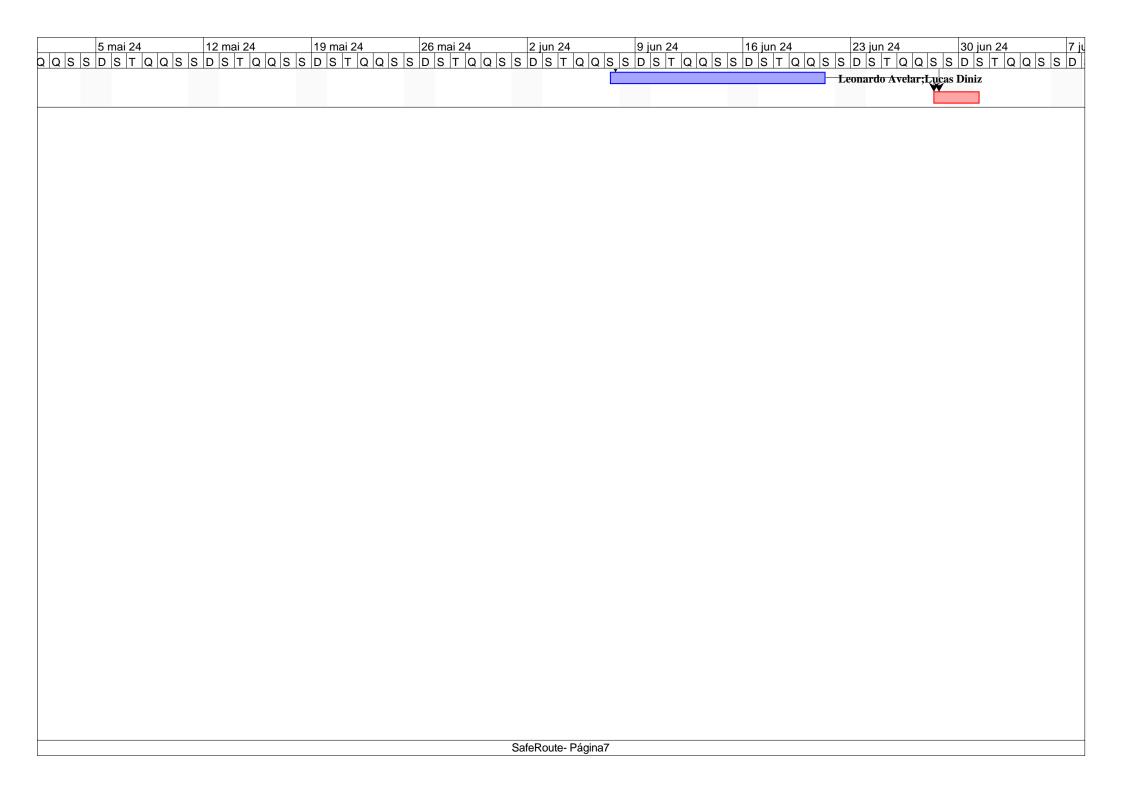

_																									
II 24 S T Q Q S S						14	ju	24	ļ .				21 jul 24 D S T Q Q S S								28 jul 24				
S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Τ	Q		
									Saf	eR	out	e- F	Pág	ina	8										
_																									
